



COMUNE DI CASTEL MAGGIORE (BO)


3° Settore LL.PP. e Ambiente

BIBLIOTECA E STRUTTURA POLIVALENTE CIG 775286281C – CUP G77H16000690004

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

Geom. Lucia CAMPANA

Via Matteotti 10 - 40013_Castel Maggiore (BO)
mail: lavori.pubblici@comune.castel-maggiore.bo.it
pec: comune.castelmaggiore@cert.provincia.bo.it
T +39 0516386751

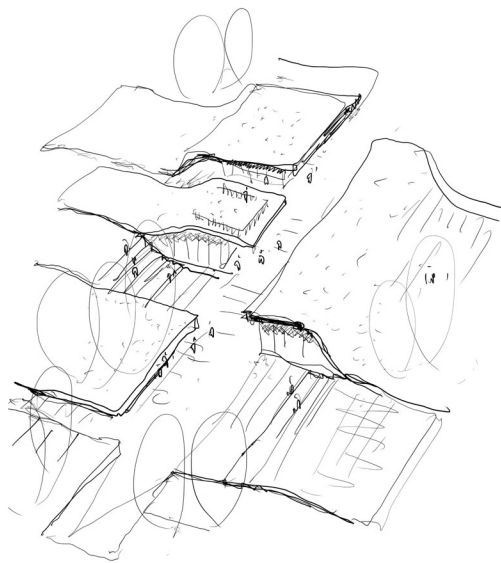

S.B.ARCH. Studio Bargone Architetti Associati 

15, via DEL COLLE DI MEZZO
I_00143 Roma (RM)
T +39 06 51981103, F +39 0742 357775
email: info@studiobargone.it
pec: federico.bargone@archiworldpec.it

Arch. **Federico BARGONE**
Arch. **Francesco BARTOLUCCI**
Arch. **Enrico AULETTA**
Ing. **Luigi LUCCIOLI**
Per. Ind. **Giorgio DEMOFONTI**
Ing. **Stefano ROSMANI**

OGGETTO:
PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

DATA
Febbraio 2020

Allegato h

Cronoprogramma

NOTE:

REV:

Comune di CASTEL MAGGIORE

Provincia di BOLOGNA

CRONOPROGRAMMA

OGGETTO: Realizzazione di un edificio ad uso Biblioteca e Struttura Polivalente - Castel Maggiore (BO)

COMMITTENTE: Comune di Castel Maggiore (BO)

Roma, 28/02/2020

Il Tecnico
(dott. arch. Federico Bargone)

Comune di CASTEL MAGGIORE

Provincia di BOLOGNA

Tabella Attività

OGGETTO: Realizzazione di un edificio ad uso Biblioteca e Struttura Polivalente - Castel Maggiore (BO)

COMMITTENTE: Comune di Castel Maggiore (BO)

Roma, 28/02/2020

Il Tecnico
(dott. arch. Federico Bargone)

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
Allestimento del cantiere ed apprestamenti sicurezza	47'122,45	1,44	01/03/2021	24/11/2021	192	269
Demolizioni e rimozioni	16'580,85	0,51	06/03/2021	10/03/2021	3	5
Movimenti terra	23'656,55	0,72	11/03/2021	17/03/2021	5	7
Fondazioni speciali	224'548,13	6,87	18/03/2021	07/04/2021	15	21
Strutture in c.a.	490'937,02	15,01	08/04/2021	09/06/2021	45	63
Strutture in acciaio	153'204,67	4,68	10/06/2021	14/07/2021	25	35
Strutture in legno	94'227,05	2,88	15/07/2021	28/07/2021	10	14
Murature di tamponamento	44'431,54	1,36	29/07/2021	27/08/2021	22	30
Isolamenti ed impermeabilizzazioni	206'960,40	6,33	28/08/2021	27/09/2021	21	31
Opere di finitura in copertura	257'399,18	7,87	28/09/2021	25/10/2021	20	28
Rivestimenti esterni di facciata	36'511,99	1,12	26/10/2021	02/11/2021	5	8
Infissi e vetrate esterne	309'186,55	9,45	03/11/2021	08/12/2021	25	36
Tramezzature e contropareti	46'596,01	1,42	09/12/2021	14/01/2022	26	37
Controsoffitti	28'991,07	0,89	13/05/2022	01/06/2022	14	20
Intonaci, tinteggiature e trattamenti	88'514,94	2,71	03/11/2021	08/12/2021	25	36
Massetti, pavimenti e rivestimenti	129'475,79	3,96	16/03/2022	12/05/2022	41	58
Parapetti e ringhiere	54'084,45	1,65	01/06/2022	08/06/2022	6	8
Infissi interni	37'805,05	1,16	01/06/2022	29/06/2022	21	29
Impianti elevatori	50'754,34	1,55	01/06/2022	15/06/2022	11	15
Impianti idrici, di scarico ed antincendio	167'672,08	5,13	15/01/2022	15/06/2022	21	29
	<i>periodo 01</i> 79'843,85	<i>2,44</i>	<i>15/01/2022</i>	<i>28/01/2022</i>	<i>10</i>	<i>14</i>
	<i>periodo 02</i> 87'828,23	<i>2,69</i>	<i>01/06/2022</i>	<i>15/06/2022</i>	<i>11</i>	<i>15</i>
Impianti meccanici di termoventilazione	235'492,32	7,20	15/01/2022	13/07/2022	64	90
	<i>periodo 01</i> 121'425,73	<i>3,71</i>	<i>15/01/2022</i>	<i>02/03/2022</i>	<i>33</i>	<i>47</i>
	<i>periodo 02</i> 114'066,59	<i>3,49</i>	<i>01/06/2022</i>	<i>13/07/2022</i>	<i>31</i>	<i>43</i>

[illegible]

COMMITTENTE: Comune di Castel Maggiore (BO)
TABELLA DELLE ATTIVITA'
